

Mise aux normes, réaménagement et rénovation des 6A-7A-8A Hôpital du Suroît

- Mise aux normes de l'unité d'endoscopie du 6A
- Rénovation des unités de soins au 7A et 8A

Mise aux normes de l'endoscopie – 6A

Mise en contexte:

- Les installations existantes ne permettaient pas un parcours unidirectionnel du retraitement des endoscopes entre le souillé, le propre et le stérile.

Enjeux

Enjeux cliniques:

- Potentiel de contamination croisée
- Mise aux normes de la ventilation des salles d'examen (endoscopie, cystoscopie, bronchoscopie)
- Absence de confidentialité dans la salle de recouvrement et au poste de garde


Enjeux de chantier:

- Durée du chantier estimée à 2 ans
- Maintien des activités cliniques durant les travaux
- Maintien des activités du bloc opératoire et de la CDJ
- Unité mère-enfant située au 5A, sous la zone de chantier
- Gestion de la vibration et du bruit vs les interventions médicales (ophtalmologie, endoscopie)

Mesures de mitigation d'impacts

- Travaux en 6 phases adaptées aux besoins cliniques
- Pré-phase de travaux pour réorganiser les opérations courantes et maintenir les services aux patients (examens endoscopiques, chirurgie d'un jour, ophtalmologie et salle de recouvrement du bloc opératoire)
- Coordination quotidienne avec la chef de la CDJ et adaptation des horaires de travaux pour accommoder les besoins cliniques afin de minimiser bruit et vibration
- Travaux effectués en phases verticales et en parallèle avec les travaux des 7^e et 8^e étages afin de minimiser les interventions hors chantier
- Cloisons temporaires en mélamine
- Nettoyages quotidiens des aires de soins avec la zamboni de l'entrepreneur
- Collaboration exceptionnelle du personnel médical


Phases des travaux au 6A

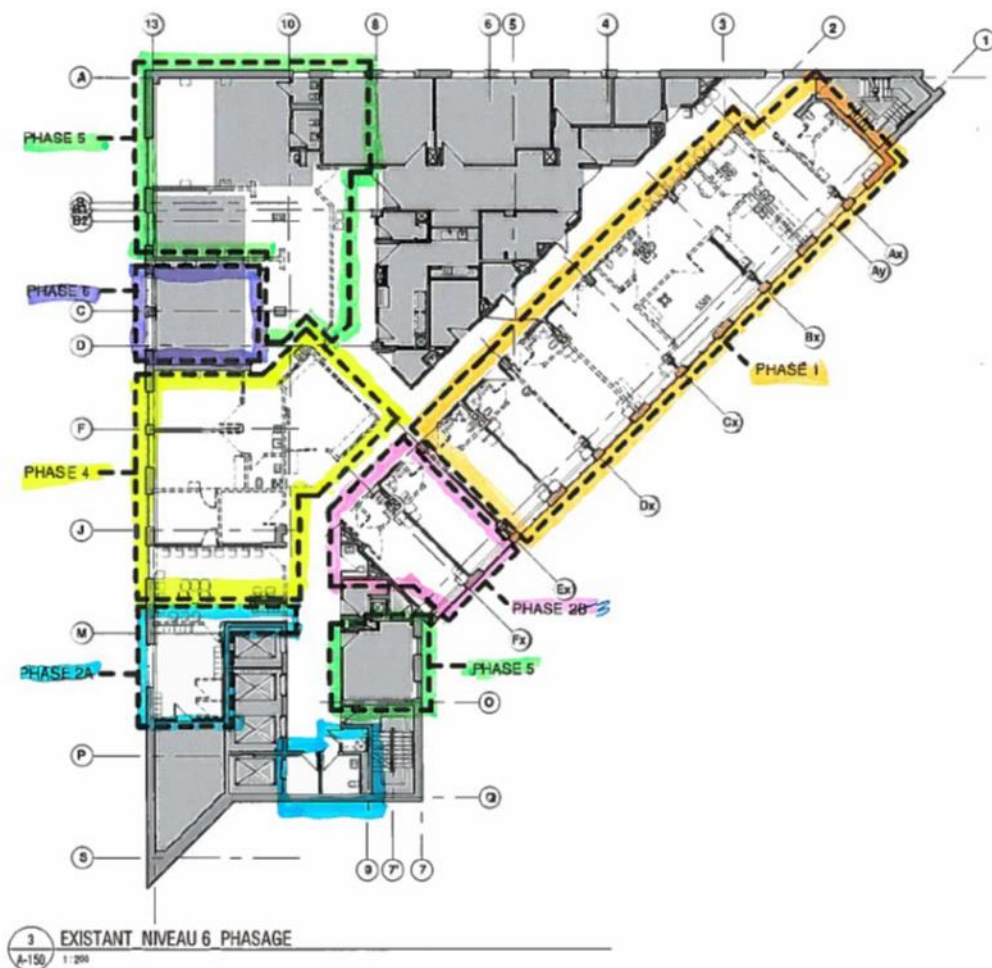


7A



Plan du réaménagement 6A

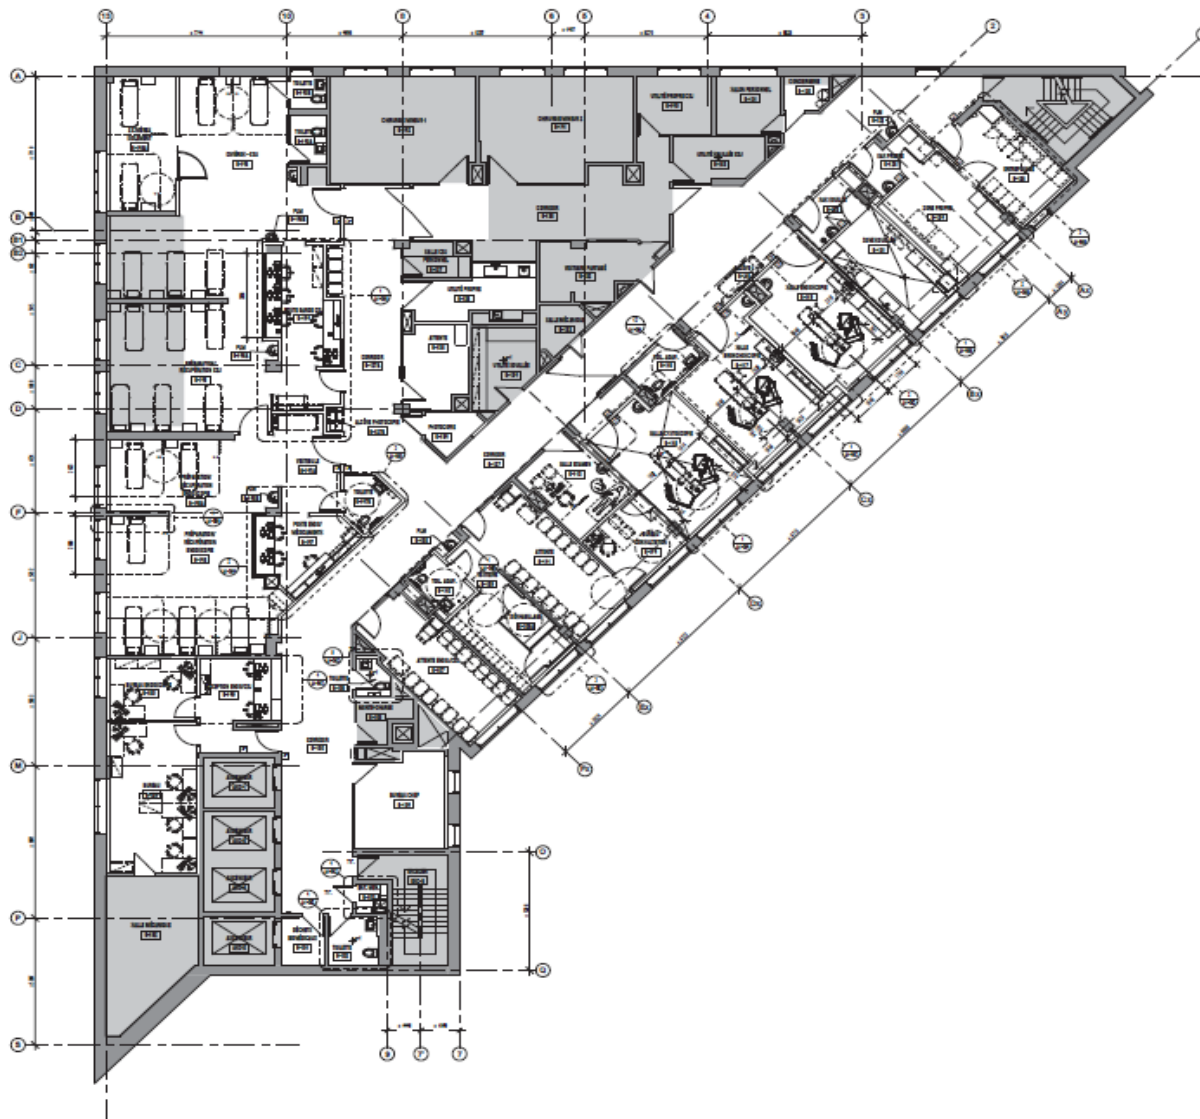

Cloisons temporaires

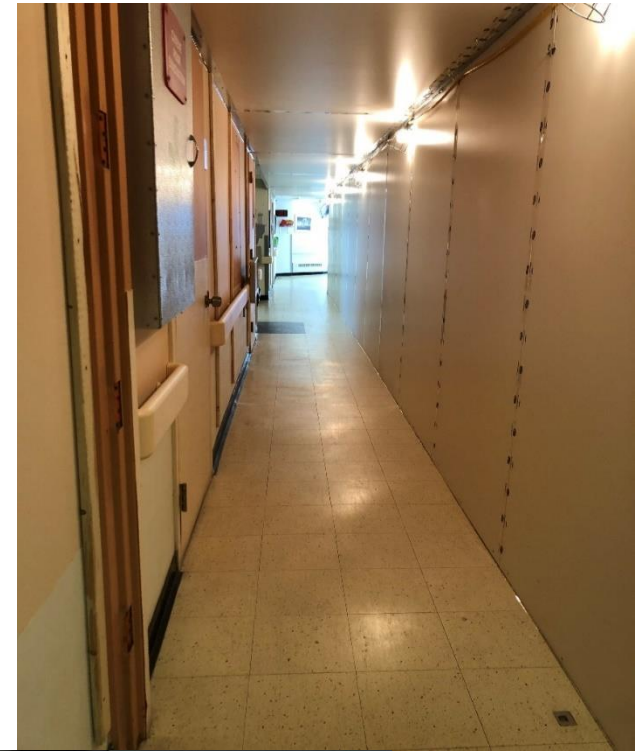

Principaux locaux affectés par les travaux au 6A

- Locaux de retraitement des dispositifs médicaux (URDM):
 - Zone souillée
 - Zone propre
 - Réserve stérile
- 3 Salles de traitements
 - Cystoscopie
 - Endoscopie
 - Bronchoscopie
- Poste d'accueil
- Poste de garde
- Salle de recouvrement
- Bureaux d'examens médicaux
- Salles d'attente
- Vestiaire des patients
- Corridors

URDM – zones souillée / propre avant les travaux



URDM - nouvelle zone de traitement des dispositifs souillés



URDM - Du souillé au propre

Étagère de matériel et passe-objets



URDM – Nouvelle zone propre (laveurs)



URDM – Nouvelle réserve de matériel stérile




Salles de traitement avant les travaux



Nouvelles salles de traitement



Nouvelles salles de traitement

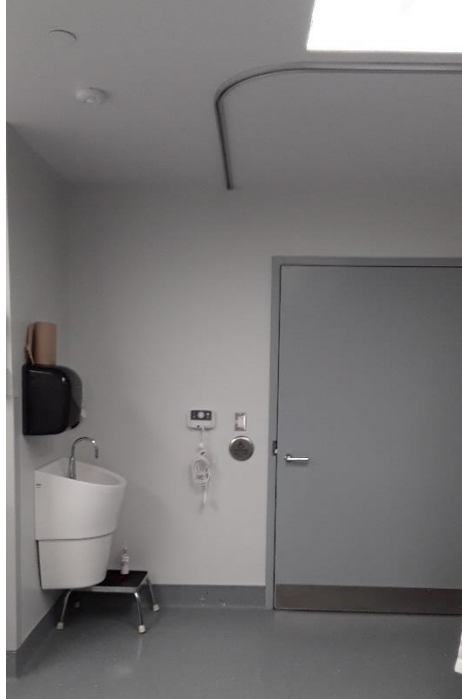


Éclairage et ventilation des salles



Endoscopie/CDJ - Nouveau poste d'accueil

Ancien poste d'accueil

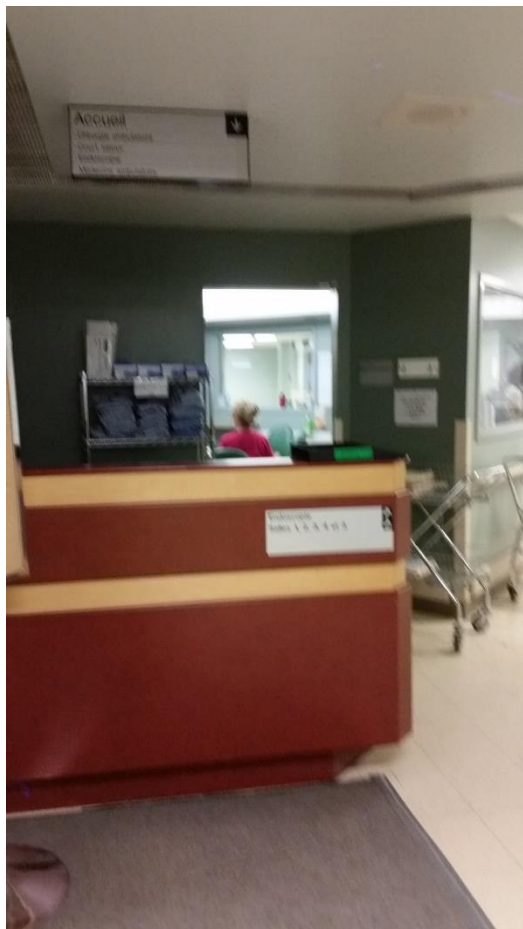

Nouveau poste d'accueil




Endoscopie – Poste de garde avant les travaux



Endoscopie – Nouveau poste de garde




Endoscopie – Nouveau poste de garde de la salle de recouvrement

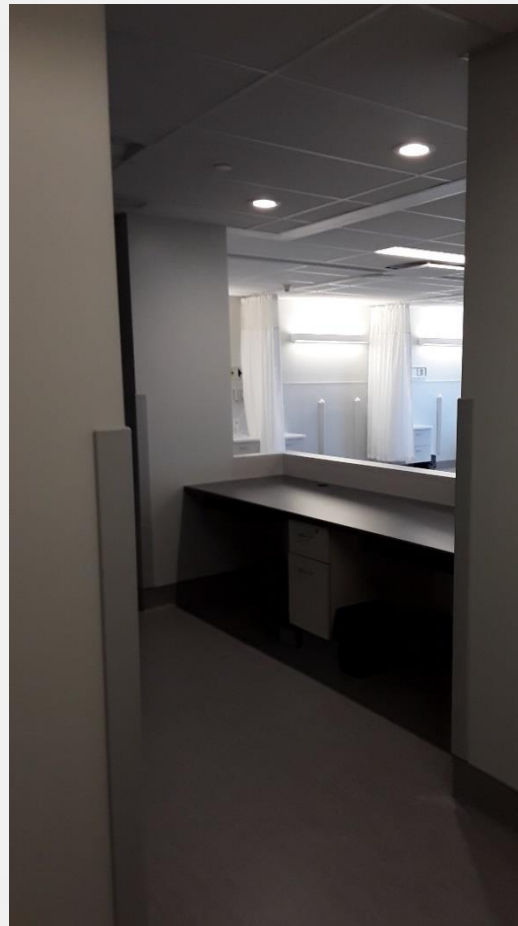

CDJ - Poste de garde de la salle de recouvrement avant les travaux



CDJ - Nouveau poste de garde

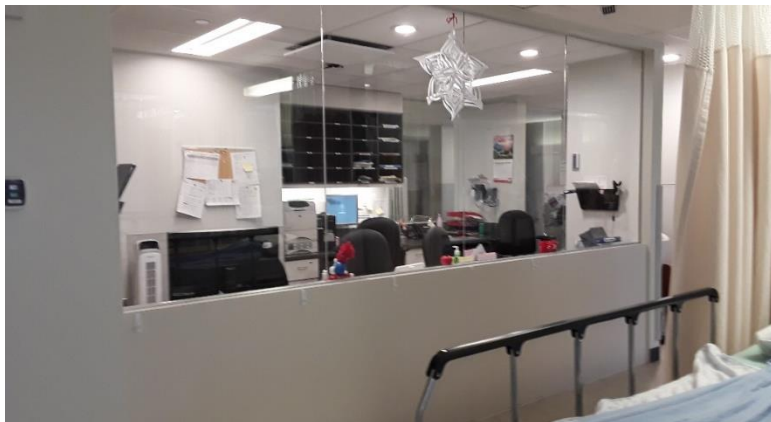

Endoscopie – Salle de recouvrement avant les travaux





Endoscopie - Nouvelle salle de recouvrement



Salle d'attente et vestiaire



Corridors

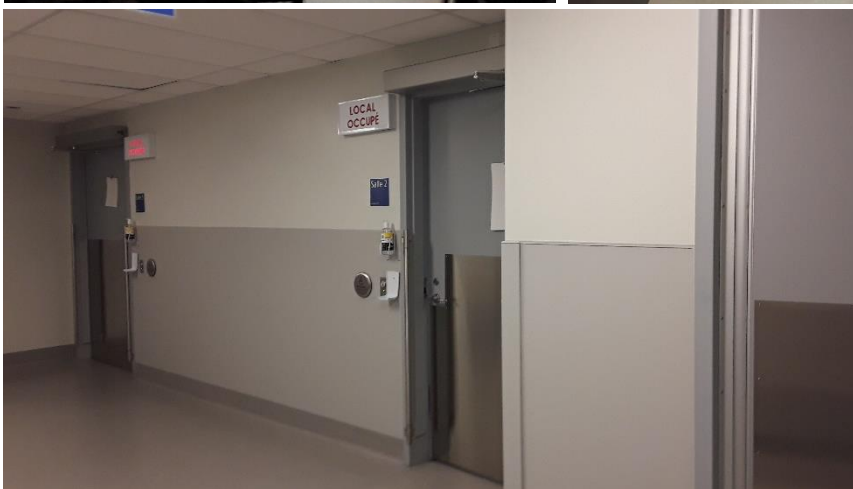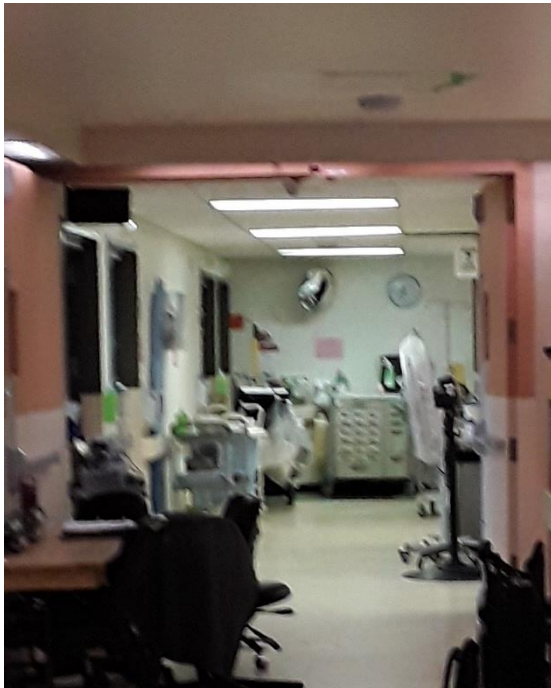

Réaménagement des unités de soins des 7A et 8A

Mise en contexte:

- L'objectif de la rénovation est de désengorger les unités de soins en réduisant le nombre de lits passant de 45 à 36 lits par unité. Un transfert de 17 lits vers l'unité de médecine située au 2B a permis d'éliminer les chambres de 3 et de 4 lits et d'augmenter le nombre de chambres à 1 lit.
- Les rénovations visent également à désengorger les corridors, augmenter à quatre le nombre de salles d'isolement respiratoire et d'en faire une mise aux normes, agrandir les locaux de services dont le poste de garde et créer des zones séparées pour les médecins, les infirmières et les stagiaires.

Enjeux

- Maintenir les opérations courantes sur chaque unité
- Réduction importante du nombre de lits durant les travaux
- Unité de soins temporaire du 3A non disponible
- Gestion du bruit et de la vibration en travaux de démolition
- Nombreuses coupures de services (eau, gaz, électricité...)
- Réduction de la largeur des corridors
- Durée du chantier en 6 phases échelonnées sur 2 ans
- Relocalisations temporaires multiples du noyau (médicaments, lingerie, hygiène salubrité, stagiaires, médecins)
- Utilisation des ascenseurs par l'entrepreneur

Mesures de mitigation d'impacts

- Travaux en 6 phases adaptées aux besoins cliniques élaborés avec la coordonnatrice et la gestion des lits, considérant le nombre total de lits dans l'hôpital
- Travaux effectués en phases verticales et en parallèle avec les travaux du 6^e étage afin de minimiser les interventions hors chantier et les coupures de services
- Cloisons temporaires en mélamine et isolant acoustique
- Travaux de nuit et de fin de semaine
- Enlèvement de certaines portes
- Nettoyages quotidiens des aires de soins avec la zamboni de l'entrepreneur
- Collaboration exceptionnelle du personnel médical
- Élaboration d'un horaire de livraison et d'usage de l'ascenseur par l'entrepreneur

Principaux locaux affectés par les travaux des 7A et 8A – tous les locaux ont été rénovés

- Postes de garde, bureaux des médecins, bureaux des stagiaires
- Corridors
- Chambres de patients
- Chambres d'isolement en pression négative
- Noyaux: salles de médicaments, utilités propres – souillées, cuisinettes, salles d'hygiène, rangements de matériel roulant, salles de repos
- Alcôves à chariots
- Physiothérapie – ergothérapie
- Bureau des travailleuses sociales

Plan des unités de soins



Postes de garde avant les travaux

Ancien poste 7A



Ancien poste 8A



Nouveaux postes de garde, vus de l'entrée de l'unité

7A




8A



Nouveaux postes de garde



Bureaux des médecins et stagiaires

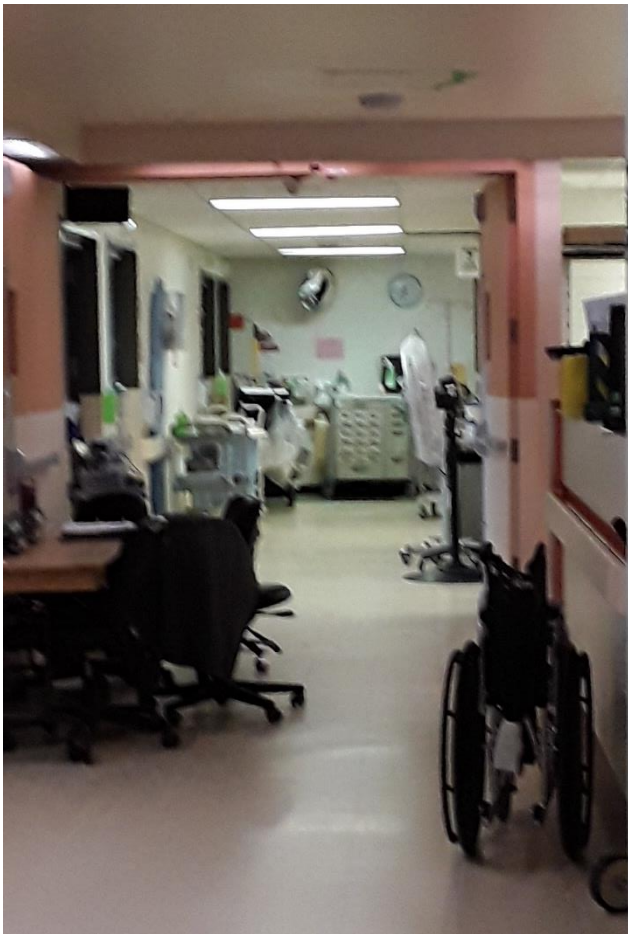

Corridors

Avant les travaux



Corridors rénovés



Corridors renovated




Corridors rénovés



Chambres de patients avant les travaux



Chambres rénovées

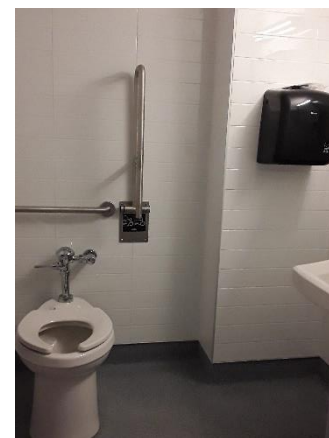

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Québec

Chambres rénovées

SAS et chambre
d'isolement



Services

Utilités souillées





Salles d'hygiène



Alcôves de rangement



Postes de lavage de mains

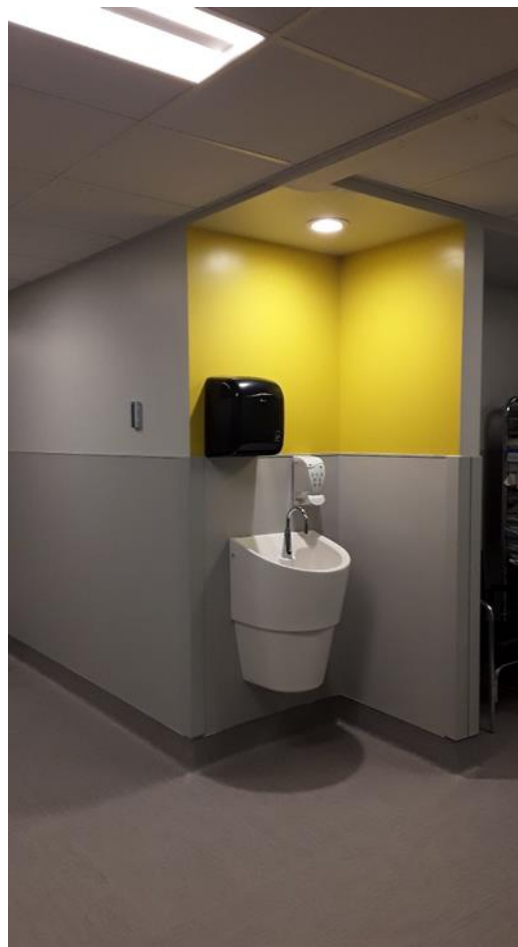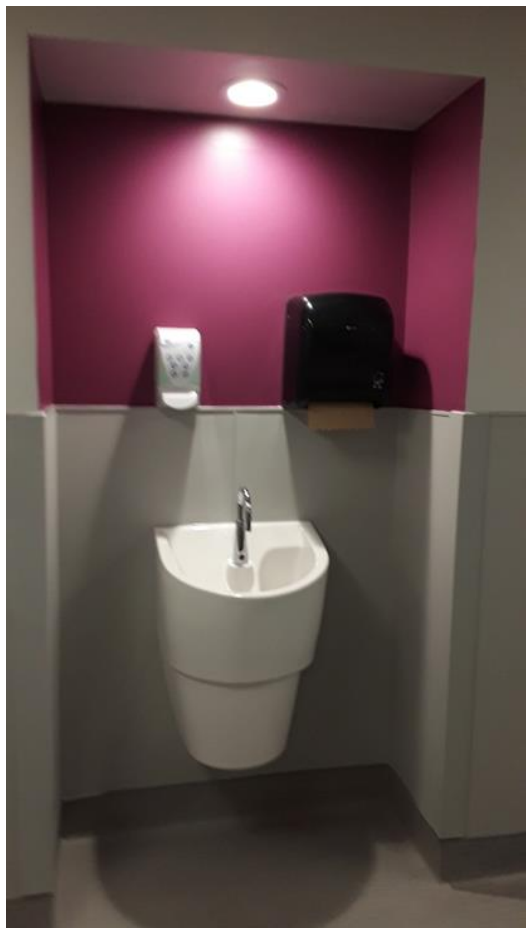

Expériences à retenir

- Prévoir de la protection murale partout
- Prévoir des protecteurs de cadres à rouleaux
- Organisation de l'espace avec alcôves de rangement
- Éviter le mobilier intégré dans les chambres
- Pare-chocs de lit inutiles et encombrants
- Porte pliante à pivot: instable
- Cloisons temporaires en mélamine: installation rapide, propres, solides et étanches
